AVANCES

Banco Provincia

TIPO
- DIRECTA
- PRIVADA
- PÚBLICA

COMPRADOR
- GARCIA
- MARTINEZ
- TORRES

ESTADO
- EJECUCIÓN
- REC. PROV.

RUBRO: Todas

PROVEEDOR: Todas

N° LICITACION: Todas

UBICACIÓN	Rubro	Último Vencimiento	% Avance
JUAN JOSÉ PASO	BANCA ELECTRÓNICA	29/11/2025	100,00 %
CASA CENTRAL	ADECUACIONES	24/11/2025	99,78 %
CASA CENTRAL Y ANEXO	ADECUACIONES	24/4/2026	96,99 %
BECCAR	REMODELACIÓN INTEGRAL	28/3/2026	96,40 %
ALMAFUERTE	ALARMA	10/3/2026	96,31 %
TRES ARROYOS	CABLEADO	20/4/2026	93,76 %
CASA MATRIZ LA PLATA	ADECUACIONES	24/12/2025	93,75 %
VILLA RAMALLO	ALARMA	19/1/2026	92,43 %
ROJAS	BANCA ELECTRÓNICA	29/11/2025	90,73 %
SAN CAYETANO	ADECUACIONES	27/8/2025	89,99 %
ANEXO ESQUINA	ADECUACIONES	31/10/2025	89,73 %
ZARATE	BANCA ELECTRÓNICA	30/9/2025	89,34 %
ANEXO PERÓN	ADECUACIONES	17/12/2025	79,37 %
BRANDSEN	ADECUACIONES	2/5/2026	77,09 %
CHASCOMUS	REMODELACIÓN INTEGRAL	5/10/2026	31,13 %
GUANAHANI	ADECUACIONES	3/5/2026	26,18 %
PALACIO RECONQUISTA, CASA CENTRAL, ANEXO CASA CENTRAL	ADECUACIONES	9/8/2026	20,85 %

Licitación	Ubicación	Vto. Original	Vto+Amp+LNI	Días de Atraso	Estado
	ALMAFUERTE	24/11/2025	24/11/2025	92	EJECUCIÓN
11.285	BRANDSEN	26/3/2026	2/5/2026	-9	EJECUCIÓN
11.542	VILLA RAMALLO	28/1/2026	13/4/2026	10	EJECUCIÓN
11.741	PALACIO RECONQUISTA, CASA CENTRAL, ANEXO CASA CENTRAL	9/8/2026	9/8/2026	-108	EJECUCIÓN
12.043	EDIFICIO REGIÓN Y CASA MATRIZ LA PLATA Y ANEXO CRÉDITO HIPOTECARIO LA PLATA	8/8/2026	12/8/2026	-111	EJECUCIÓN
12.525	CASA CENTRAL	31/12/2025	14/2/2026	-12	REC. PROV.
50.525	ANEXO ESQUINA	2/8/2025	31/10/2025	15	REC. PROV.
51.084	VILLA ITALIA	15/10/2025	15/10/2025	51	REC. PROV.
52.266	ALMAFUERTE	31/10/2026	31/10/2026	-191	EJECUCIÓN
52.340	VILLA RAMALLO	19/1/2026	19/1/2026	-5	REC. PROV.
53.456	ZARATE	17/8/2025	30/9/2025	80	REC. PROV.
53.483	ROJAS	28/9/2025	29/11/2025	20	REC. PROV.
53.593	CHASCOMUS	5/10/2026	5/10/2026	-165	EJECUCIÓN
53.752	VILLA ITALIA	31/7/2025	31/7/2025	92	REC. PROV.
54.386	2° SS EDIFICIO CASA CENTRAL Y PATIO INGLES	19/1/2026	6/3/2026	48	EJECUCIÓN
54.422	SAN CAYETANO	27/8/2025	27/8/2025	239	EJECUCIÓN
56.216	JUNIN	30/7/2025		46135	EJECUCIÓN
56.482	BECCAR	14/12/2025	28/3/2026	26	EJECUCIÓN
56.572	VILLA INSUPERABLE	14/12/2025	2/3/2026	52	EJECUCIÓN

Vencimientos Responsabilidad Civil

Licitación	Ubicación	Estado	Vto. Garantía	Vto. RC
11.285	BRANDSEN	EJECUCIÓN		19/4/2026
11.542	VILLA RAMALLO	EJECUCIÓN		28/2/2026
11.741	PALACIO RECONQUISTA, CASA CENTRAL, ANEXO CASA CENTRAL	EJECUCIÓN		21/7/2026
12.043	EDIFICIO REGIÓN Y CASA MATRIZ LA PLATA Y ANEXO CRÉDITO HIPOTECARIO LA PLATA	EJECUCIÓN		19/08/2026
52.266	ALMAFUERTE	EJECUCIÓN		24/9/2026
53.593	CHASCOMUS	EJECUCIÓN		10/9/2026
54.386	2° SS EDIFICIO CASA CENTRAL Y PATIO INGLES	EJECUCIÓN		31/3/2026
54.422	SAN CAYETANO	EJECUCIÓN		29/8/2025
56.216	JUNIN	EJECUCIÓN		15/7/2026
56.482	BECCAR	EJECUCIÓN		6/5/2026

Banco Provincia

Ubicación

ANEXO JUNIN

53.598
ANEXO JUNIN
CELTEC SERVICIOS S.R.L.
$14.626.713,18

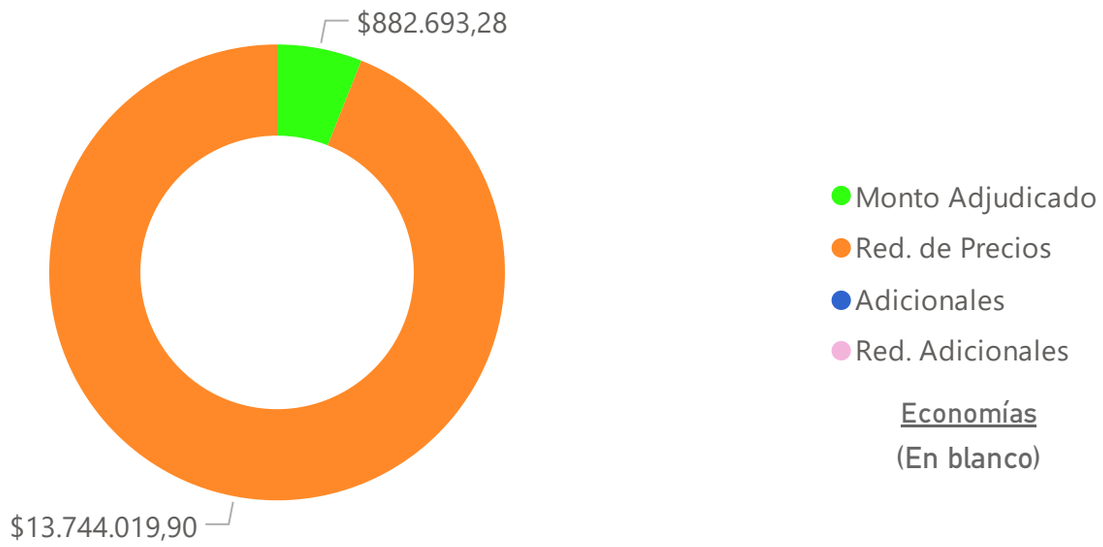

Observaciones

EN GARANTIA

Plazo de Obra
210

Plazo + AMP/LNI
2411

Días transcurridos
2666

Días restantes
-255

Avance
(En blan...

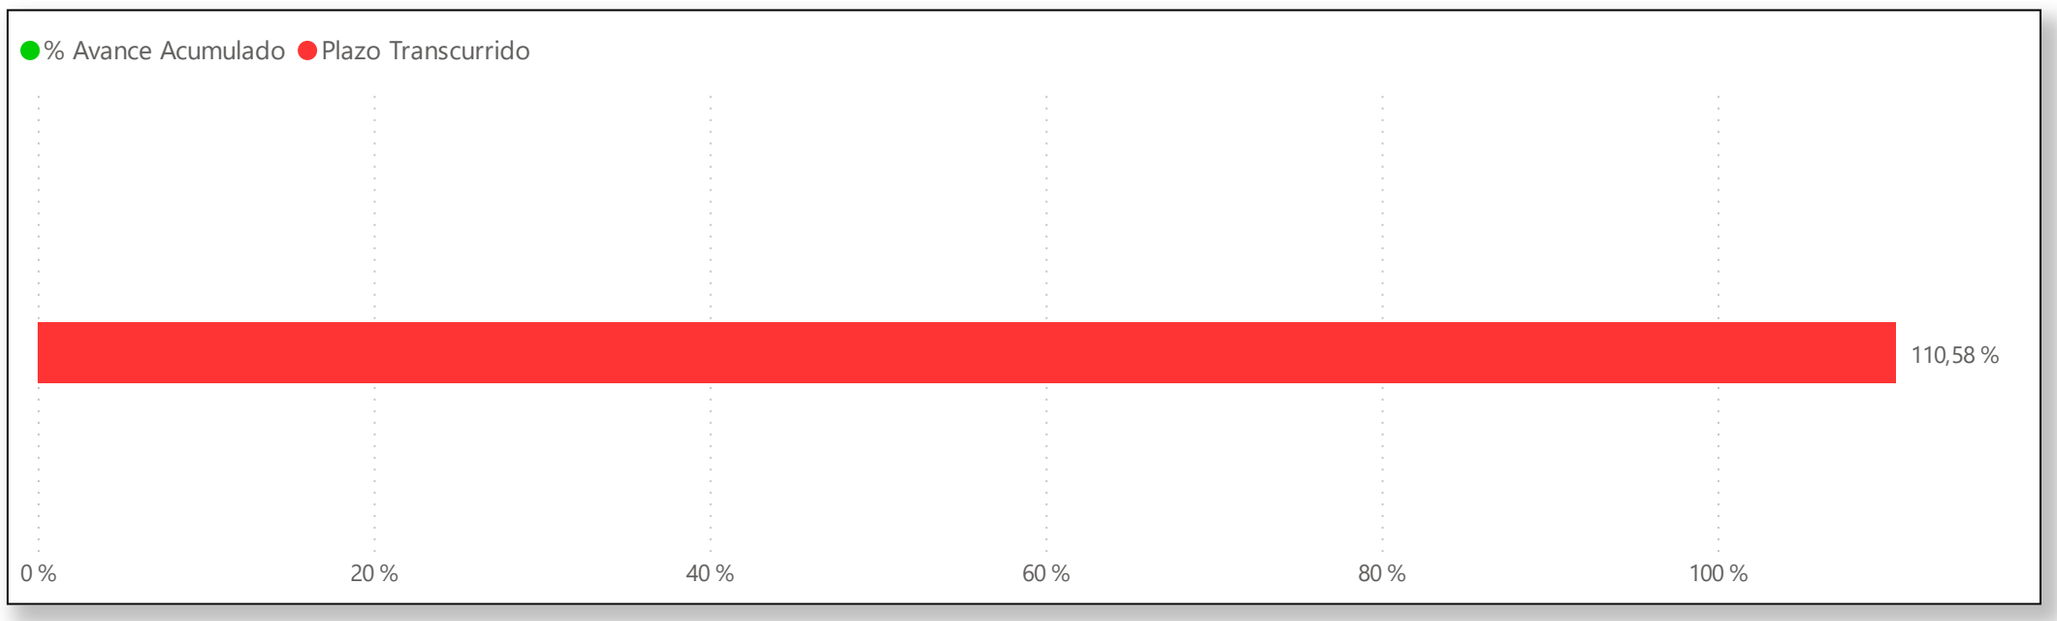

Total Multas

(En blanco)

Resumen de Obras

Banco Provincia

CANTIDAD

22

PROVEEDOR

Todas

ESTADO

EJECUCIÓN

LOCACION

Todas

DESCRIPCION

Todas
